Informe de cierre del día — 2026-09-25

Para: Ing. Franco Clavo Santander — Product Owner y sponsor de Riesgos No Financieros

De: Cesar Adrian Guevara Salcedo — Developer y Scrum Master interino

Fecha: 25 de septiembre de 2026

Asunto: Cierre de Sprint 1 — C-04, C-06, C-08 y C-09 materializados en `main`

Este informe cierra la jornada del 2026-09-25 sobre `main` en el commit `6c78e27` (merge de PR #17, C-09). Con este merge quedan materializados en `main` los últimos componentes pendientes de Sprint 1: **C-08** (contrato operativo Wazuh) y **C-09** (CI seguro y evidencia), sumados a C-04 y C-06 ya cerrados. Complementa el Daily Scrum y el informe de cierre de 2026-09-24; no los reemplaza.

Resumen ejecutivo

Sprint 1 — Base ejecutable y contratos llega a su recta final con los nueve componentes (`C-01` … `C-09`) presentes en `main`, aunque **no todos con aceptación técnica completa**: dos de ellos avanzan por excepción explícita del Product Owner, no por evidencia end-to-end real. Este informe es deliberadamente preciso sobre esa diferencia — el propio repositorio lo es:

ID	Estado real en `main`	Matiz obligatorio
C-01, C-02, C-03, C-05, C-07	`DONE`	Sin cambio, evidencia previa
C-04 — persistencia de admisión	`DONE`	Confirmado en CI (run `36154234794`)
C-06 — entorno de integración	`DONE`	E2E real Wazuh/OpenSearch en Railway, excepción de capacidad de pruebas aceptada
C-08 — contrato operativo Wazuh	**`DONE` solo para habilitar Sprint 2, por excepción del PO**	La integración real contra Manager/Indexer autorizados **no se ejecutó**; queda como gate obligatorio del E2E final del MVP
C-09 — CI seguro y ownership	**`IMPLEMENTED / BLOCKED_BY_REPOSITORY_ADMINISTRATION`** , no `DONE`	CI y evidencia pasan, pero el repo no tiene protección de rama ni CODEOWNERS activos; el propio documento se niega a declararlo `DONE`


C-08 — contrato `SecurityEventProvider` para Wazuh

Implementado en `modules/connectors` : puerto neutral de capabilities/health/ query/paginación, provider Wazuh de solo lectura con allowlist de índice, orden `timestamp` + `id` , cursor firmado con HMAC/TTL, y un cliente Manager que obtiene JWT con single-flight para evitar renovaciones

concurrentes. Configuración C-03 añadida para índice, dataset, secreto de firma de cursor y credenciales separadas de Manager/Indexer, todas resueltas vía `SecretProvider` — nada de secretos reales en el repo.

Resultado real de la contract suite (26 pruebas, entorno simulado):

Métrica	Valor
Test suites	4/4 PASS
Pruebas totales	26/26 PASS
Verificaciones contractuales cubiertas	18 (capabilities, health, orden, determinismo, paginación, cursores, límites, cancelación, errores, neutralidad, escrituras)
Unit suite del workspace	237/237 PASS
Typecheck / lint / boundaries	PASS (123 módulos, 168 dependencias)

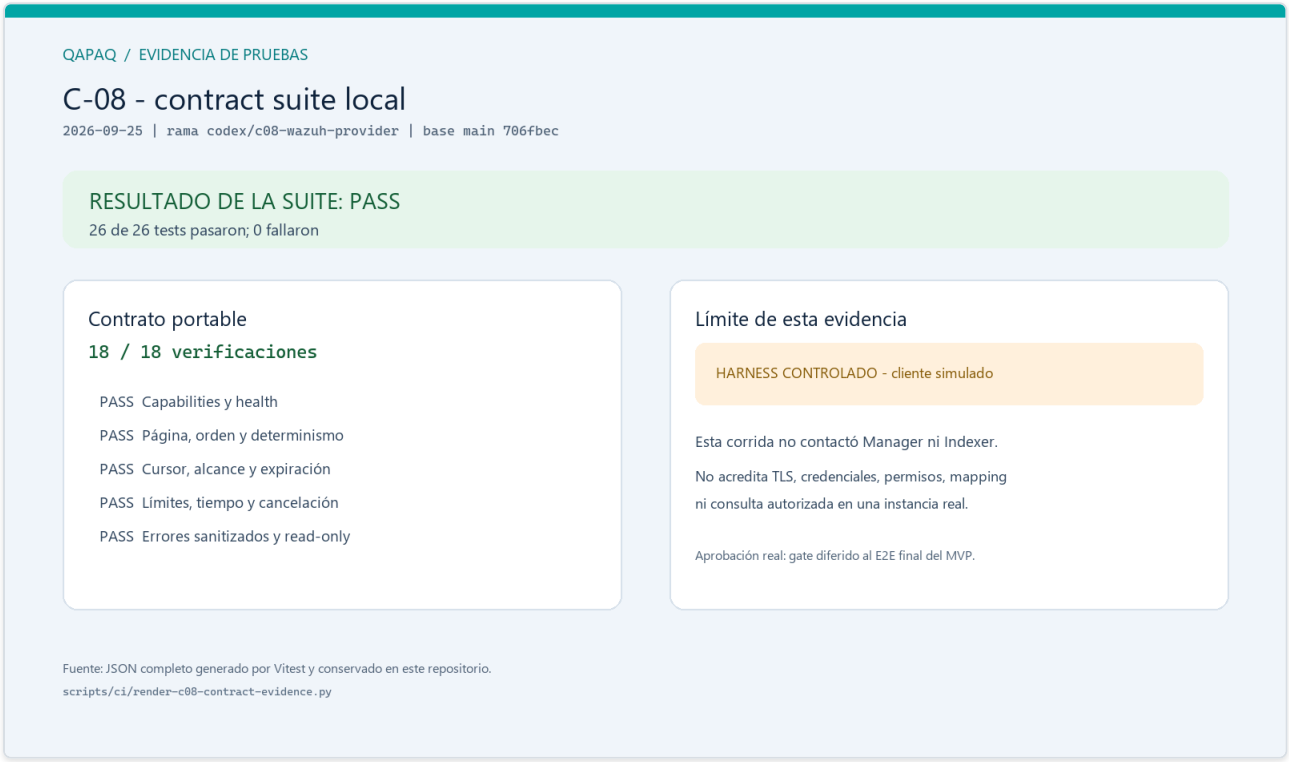

Lo que esta evidencia NO cubre, tal como lo deja escrito el propio `c-08/README.md`: la contract suite corrió contra un cliente simulado, no contra un Manager o Indexer Wazuh real. La sesión no tenía `QAPAQ_WAZUH_*` configuradas, Docker Desktop falló al abrir `dockerInference`, y el proyecto Railway aislado creado para C-08 (`qapaq-c08-wazuh-e2e-20260925`) quedó **vacío**, sin máquinas desplegadas. TLS/ autenticación real, el mapping estable del índice, el evento sintético Manager → Indexer → provider, y la denegación real de escritura siguen `BLOQUEADO`. Por eso el estado se registra explícitamente como "*DONE para Sprint 2 por excepción del Product Owner*" y no como aceptación técnica: la excepción habilita empezar a construir sobre el contrato en Sprint 2, no certifica que Wazuh real ya fue consultado.

C-09 — CI seguro y evidencia: implementado, no `DONE`

PR #16 (`ci: add C-09 security evidence`) se fusionó como `c6d235b` ; el propio workflow de evidencia (run 36179387219) confirmó que el artifact `c09-ci-evidence-c6d235b82a88904b3e129103e861f17bd1534f40` no tiene fugas (Gitleaks limpio), sus seis archivos allowlisted verifican por `sha256sum` y el ZIP descargado coincide con el digest publicado por GitHub. La auditoría del histórico PR #2 (fusionado 2026-09-21) no encontró secretos, acciones sin fijar ni `pull_request_target` .

A pesar de ese resultado limpio, el estado se registra como **`IMPLEMENTED / BLOCKED_BY_REPOSITORY_ADMINISTRATION`** , no `DONE` : el plan de GitHub del repositorio privado no aplica reglas de protección de rama ni `required checks` , no hay CODEOWNERS ni revisión independiente activa, y no se probó un canario sintético vía fork controlado. Franco confirmó que Cesar es el único mantenedor humano y eximió la revisión independiente mientras eso se mantenga — la misma decisión ya registrada el 2026-09-24 — pero esa excepción **no sustituye** el criterio de aceptación documentado originalmente para C-09, y el propio componente lo deja escrito así en vez de maquillarlo como cierre completo.

Backlog y decisiones vigentes

- **Sprint 2** puede avanzar con los contratos locales de C-08 aunque Wazuh real siga sin conectarse; PBI-007 y cualquier provider spec que dependa de Wazuh autorizado permanecen `BLOCKED` hasta tener acceso real — el timebox 2026-10-05/06 ya no presupone que **todos** los accesos estén listos, por decisión explícita del Product Owner del 2026-09-25.
- **PBI-006** (Microsoft 365) y la excepción de protección de rama siguen vigentes sin cambios hoy (ver informes anteriores).
- Ningún PBI se declara `DONE` en este informe; los cambios de hoy son de estado de componente (`C-xx`), no de aceptación de PBI.

Riesgos y bloqueos vigentes

Elemento	Estado	Dueño	Siguiente acción
C-08: integración real contra Wazuh Manager/Indexer autorizado	`BLOQUEADO` , gate obligatorio del E2E final del MVP	Cesar / Franco	Provisionar acceso real (tenant, credenciales, Docker o Railway funcional) antes de declarar aceptación técnica
C-09: sin protección de rama ni CODEOWNERS activos en GitHub	Riesgo de proceso aceptado explícitamente, no resuelto técnicamente	Cesar / Franco	Reevaluar si se incorpora un colaborador externo real
C-09: sin prueba controlada de fork con canario sintético	Riesgo activo	Cesar	Diseñar y ejecutar el canario antes de certificar el gate de PR no confiable
Microsoft 365 (`PBI-006`): gate técnico incompleto	Riesgo activo	Franco / Cesar	Completar scopes, ticket, dataset y conexión real de lectura

Confianza en el Sprint Goal

VERDE-ÁMBAR: los nueve componentes de Sprint 1 tienen presencia real en `main` , con evidencia técnica completa en C-01 a C-07, evidencia E2E real para C-06, y dos excepciones documentadas por el

Product Owner (C-08, C-09) que permiten avanzar a Sprint 2 sin fingir una aceptación que todavía no ocurrió. El cierre completo del MVP sigue condicionado a la integración real de Wazuh (C-08) y al gobierno de rama (C-09), ninguno de los cuales se resuelve con más código local.

Sprint 1 llega a su tramo final. 🎉



Daily Scrum · Plan de componentes · C-08 — contrato operativo Wazuh · C-09 — CI seguro y evidencia · Decisiones sin resolver · Informe de cierre de 2026-09-24
