QAPAQ

Daily Scrum | Informe de avance

Sprint 1 - Base ejecutable y contratos | 19 sep - 02 oct 2026 | Facilitador: Cesar Adrian Guevara Salcedo | America/Lima

Resumen ejecutivo

El corte de **main** es **706fbec**, con C-04 y C-06 cerrados. En la rama de trabajo **codex/c08-wazuh-provider**, basada en ese commit, se completó la implementación local de C-08 y se ampliaron sus checks contractuales. Por decisión del Product Owner, la integración real autorizada se difiere a las pruebas finales del MVP para permitir avanzar Sprint 2 sin acceso actual a Wazuh.

Estado del producto en main y rama de trabajo

Componente	Estado	Evidencia / lectura
C-04 - admisión transaccional	**DONE**	Límites, pertenencia y pruebas integradas en main.
C-06 - entorno de integración	**DONE**	CI base y E2E real OpenSearch/Wazuh; excepción de capacidad de pruebas documentada.
C-08 - contrato operativo Wazuh	**DONE***	Excepción PO para Sprint 2; E2E real obligatorio antes de aceptar MVP.
C-09 - CI y gobierno de main	**IN_PROGRESS**	Continúa pendiente confirmar branch protection y checks requeridos.

Trabajo de hoy

- C-08: puerto neutral SecurityEventProvider, health de Manager e Indexer, consulta read-only por allowlist y cursor firmado con HMAC y TTL.
- Contract suite reutilizable ampliada a 18 verificaciones; corrida dirigida: 26/26 tests, y unit completo: 237/237.
- Typecheck, lint y reglas de boundaries pasaron; boundaries inspeccionó 123 módulos y 168 dependencias.
- Los digests Wazuh 4.14.7 de un despliegue anterior C-06 quedaron fijados en el lock; no se presentan como evidencia de una corrida C-08.

Decisión de Sprint 2

C-08 queda DONE para Sprint 2 por excepción explícita del Product Owner. La lectura real autorizada, TLS, autenticación, permiso read-only, mapping y paginación siguen como gate obligatorio antes de aceptar el MVP. Los PBI que dependan de Wazuh o del tenant siguen BLOCKED; el Sprint Goal y MVP Candidate no se declaran completos.

Plan siguiente y confianza


Avanzar el trabajo de Sprint 2 con contratos y pruebas locales, sin sustituir la integración por fakes. Cuando haya acceso, ejecutar por Railway y esta máquina el flujo sintético Wazuh completo, aplicar la misma contract suite al provider real y cerrar la evidencia de TLS, mínimo privilegio, paginación y limpieza. Revisar también los checks requeridos de main.

Confianza en el Sprint Goal: ÁMBAR. El desarrollo interno puede continuar; la aceptación del origen corporativo permanece como gate del MVP.

C-08 | Gates y evidencia de hoy

*DONE para el alcance de Sprint 2 por excepción PO; aceptación técnica real pendiente. Rama codex/c08-wazuh-provider; base main 706fbec.

Gate C-08	Estado	Alcance demostrado
Puerto, tipos y barril público	**PASS local**	Contrato neutral; DTOs Wazuh/OpenSearch no se exportan.
Contract suite y consultas	**PASS local**	26 tests, incluidos 18 criterios contractuales con cliente simulado.
TLS, autenticación y permiso read-only real	**DIFERIDO**	Se prueba con instancia e identidad autorizadas durante E2E final MVP.
Evento sintético y paginación real	**DIFERIDO**	La corrida C-06 previa no se reutiliza como aceptación de C-08.

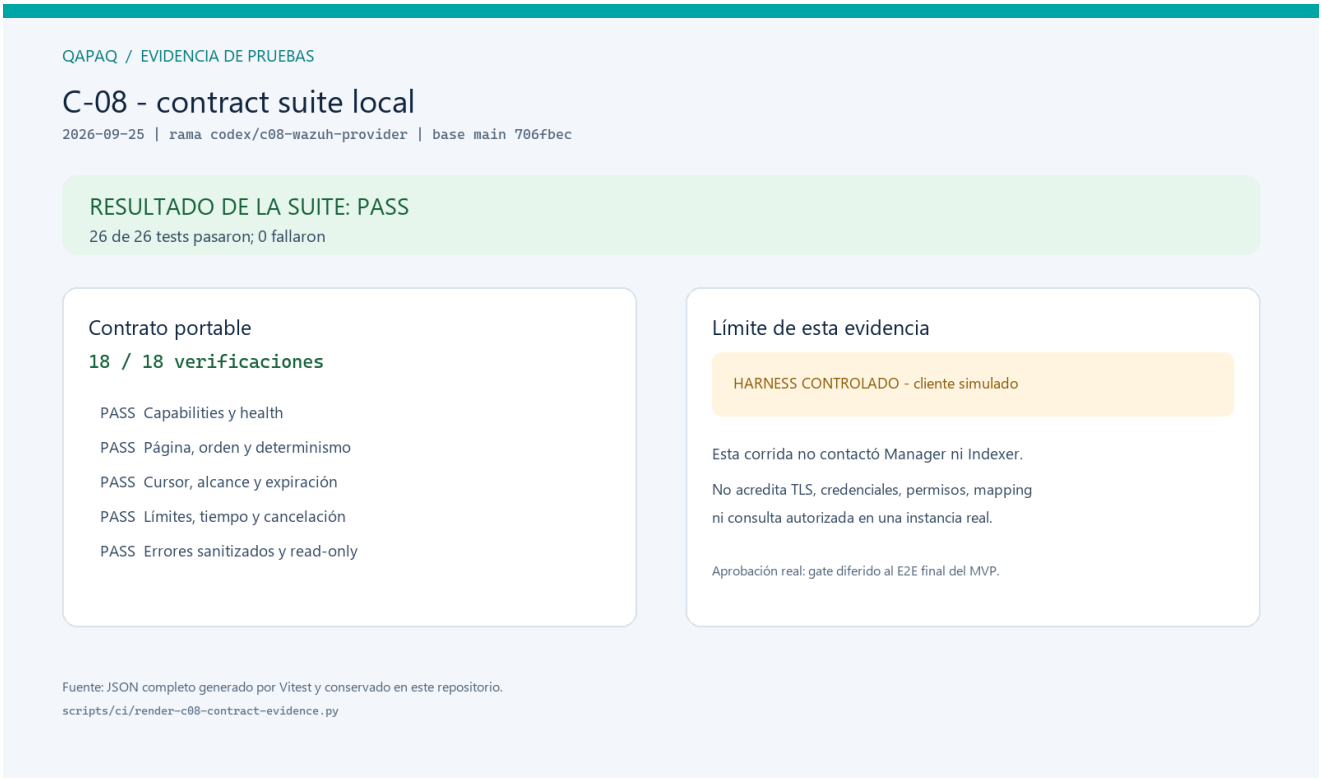

Resultado real de Vitest renderizado desde JSON versionado. El cliente Indexer del harness es simulado; la imagen no acredita conectividad contra Manager o Indexer.

Contexto de C-06

C-06 cerró antes con una alerta TCP syslog que Wazuh 4.14.7 procesó y recuperó por API. Su imagen y JSON se conservan en docs/project-management/c-06/assets/2026-09-25-c06-railway-full-e2e.png y .json; esa corrida no ejecuta C-08 ni sustituye las pruebas diferidas.
